

報 告

平成 21 年度 大山崎町バリアフリー協議会



平成 22 年 3 月 30 日 開催

大山崎ふるさとセンター

目 次

バリアフリー化に関する整備目標進捗状況

1.公共交通関係	
○阪急大山崎駅	2
○JR山崎駅	3
○バス関連	3
2.建築物関係	
○大山崎町役場	6
○大山崎町立中央公民館	8
○大山崎町立老人福祉センター長寿苑	10
3.道路関連	
●生活関連経路	12
●準生活関連経路	17
4.その他	
○JR山崎駅前広場	19

バリアフリー化に関する整備目標進捗状況

1. 公共交通関係

○阪急大山崎駅

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
エレベーターの設置	平成 22 年度	進行中	平成 22 年度末までに完成予定
多機能トイレの設置	平成 22 年度	進行中	平成 22 年度末までに完成予定
視覚障害者誘導用ブロックの設置	平成 22 年度	進行中	平成 22 年度末までに完成予定
駅構内の設備配置を示した触知図の設置	平成 22 年度	進行中	平成 22 年度末までに完成予定
可変式情報表示の設置	平成 22 年度	進行中	平成 22 年度末までに完成予定
情報案内サイン等の設置	平成 22 年度	進行中	平成 22 年度末までに完成予定
待合室の改善	平成 29 年度以降	未着手	中期目標
券売機における蹴込みの設置	平成 29 年度以降	未着手	中期目標

参考写真：バリアフリー化工事中の阪急大山崎駅



○JR山崎駅

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
駅舎におけるバリアフリー化の推進	平成 28 年度	未着手	中期目標

○バス関連

■阪急バス

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
車いすスペースやスロープを設けた低床バスの導入	平成 29 年度以降	進行中	車両の更新時に検討 写真①
バス停標識における表示の改善	平成 22 年度	進行中	大きな字の時刻表に改善 写真② 大山崎町役場前標識を埋め込み式に変更済 写真③④
低床バスの運行状況が分かる情報の提供	平成 29 年度以降	未着手	長期目標

参考写真：①阪急バス JR山崎駅



②阪急バス高橋停留所



拡大表示

③④阪急バス大山崎町役場停留所



J R山崎方面行き側



小泉橋・長岡京方面行き側

■京阪シティバス

【整備目標】

項目	目標年次	進捗状況	備考
車いすスペースやスロープを設けた低床バスの導入	平成 29 年度以降	進行中	車両の更新時に検討
バス停標識における表示の改善	平成 22 年度	完了	拡大表示 参考写真⑤
低床バスの運行状況が分かる情報の提供	平成 29 年度以降	未着手	長期目標

参考写真:⑤京阪シティバス阪急大山崎停留所



■町およびバス事業者

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
バス停の移設等による歩行経路の確保を検討	平成 22 年度	進行中	大山崎町役場前停留所を歩道整備に伴い移設

2. 建築物等関係(「大山崎町建築物特定事業計画」による)


○大山崎町役場

【整備目標】


項 目		目標年次	進捗状況	備 考
視覚障害者誘導用ブロックの整備		平成 21 年度	完了	参考写真①、②
事業量	事業費			
38m	719 千円			
オストメイト対応とした多機能トイレへの標識の設置		平成 21 年度	未着手	平成 22 年度実施予定
事業量	予定事業費			
1 箇所	10 千円			
車いす使用者用駐車施設の標識の改修		平成 21 年度	完了	参考写真③
事業量	事業費			
1 箇所	13.5 千円			
目のあらいグレーチングの改修		平成 22 年度	未着手	平成 22 年度実施予定
事業量	予定事業費			
15m	400 千円			
トイレ床面の改善 (滑り止め加工)		平成 22 年度	未着手	平成 22 年度実施予定
事業量	予定事業費			
30 m ²	150 千円			

参考写真：大山崎町役場


① 《視覚障害者誘導用ブロックの整備》



② 《視覚障害者誘導用ブロックの整備》



③ 《車いす使用者用駐車施設の標識の改修》




○大山崎町立中央公民館

【整備目標】


項 目		目標年次	進捗状況	備 考
視覚障害者誘導ブロックの整備		平成 21 年度	完了	参考写真①
事業量	事業費			
12m	160 千円			
本館正面出入口ガラス扉等における視認性の向上		平成 21 年度	進行中	外側のみ完了 写真② 内側を 22 年度実施予定
事業量	事業費			
2 箇所	10 千円			
視覚障害者誘導用ブロックの撤去		平成 22 年度	未着手	平成 22 年度実施予定
事業量	予定事業費			
18m	100 千円			
別館と本館を結ぶスロープへの手すりの設置		平成 22 年度	未着手	平成 22 年度実施予定
事業量	予定事業費			
18m	900 千円			
別館多機能トイレのオストメイト対応への改修		平成 21 年度	完了	参考写真③
事業量	予定事業費			
1 箇所	360 千円			
オストメイト対応とした多機能トイレへの標識の設置		平成 22 年度	未着手	平成 22 年度実施予定
事業量	予定事業費			
1 箇所	10 千円			
トイレ床面の改善（滑り止め加工）		平成 24 年度	未着手	
事業量	予定事業費			
45 m ²	240 千円			
本館男子トイレの小便器の改修		平成 28 年度	未着手	中期目標
事業量	予定事業費			
1 箇所	150 千円			

参考写真：大山崎町立中央公民館


① 《視覚障害者誘導用ブロックの整備》



② 本館正面出入口ガラス扉等における視認性の向上



③ 《別館多機能トイレのオストメイト対応への改修》




○大山崎町立老人福祉センター長寿苑

【整備目標】


項 目		目標年次	進捗状況	備 考
視覚障害者誘導ブロックの整備		平成 21 年度	未着手	協議中 参考写真①
事業量	予定事業費			
30m	400 千円			
オストメイト対応とした多機能トイレへの標識の設置		平成 21 年度	未着手	協議中 参考写真②
事業量	予定事業費			
1 箇所	10 千円			
居室入口付近における段の出っ張り改修		平成 21 年度	未着手	協議中 参考写真③
事業量	予定事業費			
1 箇所	50 千円			
敷地内通路における舗装の改修		平成 21 年度	未着手	協議中 参考写真④
事業量	予定事業費			
130 m ²	1,100 千円			
和室の洋室化		平成 21 年度	未着手	協議中
事業量	予定事業費			
20 m ²	1,300 千円			

参考写真：大山崎町立老人福祉センター長寿苑


① 《視覚障害者誘導用ブロックの整備》




② 《オストメイト対応とした多機能トイレへの標識の設置》



③ 《居室入口付近における出っ張り改修》



④ 《敷地内通路における舗装の改修》



3. 道路関係

●生活関連経路

■府道 ①大山崎大枝線

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○歩道の改修	平成 22 年度	進行中	

■府道 ②大山崎大枝線

【整備目標】


項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○歩道の改築	平成 22 年度	進行中	(旧役場前) 東側：用地取得完了 歩道築造約 120m完了 西側：一部用地取得完了 歩道築造約 20m完了 平成 22 年度、残用地取得、歩道、車道築造を行い全体区間 180mの完成を目指す 参考写真①
◇音響式信号への改良を検討	平成 21 年度	完了	(大山崎小学校前) 音響信号機を設置 参考写真②

参考写真：府道②大山崎大枝線

① 《歩道の改築》



② 《音響式信号機》



■府道 ③西京高槻線

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○歩道の改修	平成 28 年度	未着手	中期目標
○歩道の改築	平成 28 年度	未着手	中期目標

■府道 ④西京高槻線

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○歩道の改修	平成 28 年度	未着手	中期目標
○歩道の改築	平成 29 年度 以降	未着手	中期目標

■府道 ⑤西京高槻線

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○歩道の改修	平成 22 年度	進行中	歩道舗装修繕（薄層舗装） 参考写真①
◇運転者への注意喚起を促す道路標識の改良等を検討		進行中	横断歩道標識改良（阪急 大山崎駅前）報告済

参考写真：府道⑤西京高槻線

① 《歩道の改修》



■府道 ⑥西京高槻線

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○歩道の改修	平成 22 年度	進行中	歩道舗装修繕（薄層舗装） 参考写真①
○歩道の改築	平成 29 年度 以降	未着手	

参考写真：府道⑥西京高槻線

① 《歩道の改修》



■町道 ⑦大山崎円明寺線（町道1号線）

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○歩道の新設	平成 29 年度 以降	未着手	中期目標


※歩道の改修とは……

歩道の拡幅は行わず、勾配や段差などについて、バリアフリー化を行っていくこと。

※歩道の改築とは……

歩道を拡幅または付替えを行うとともに、整備方針に沿ったバリアフリー化を行っていくこと。

【生活関連経路 路線番号図】

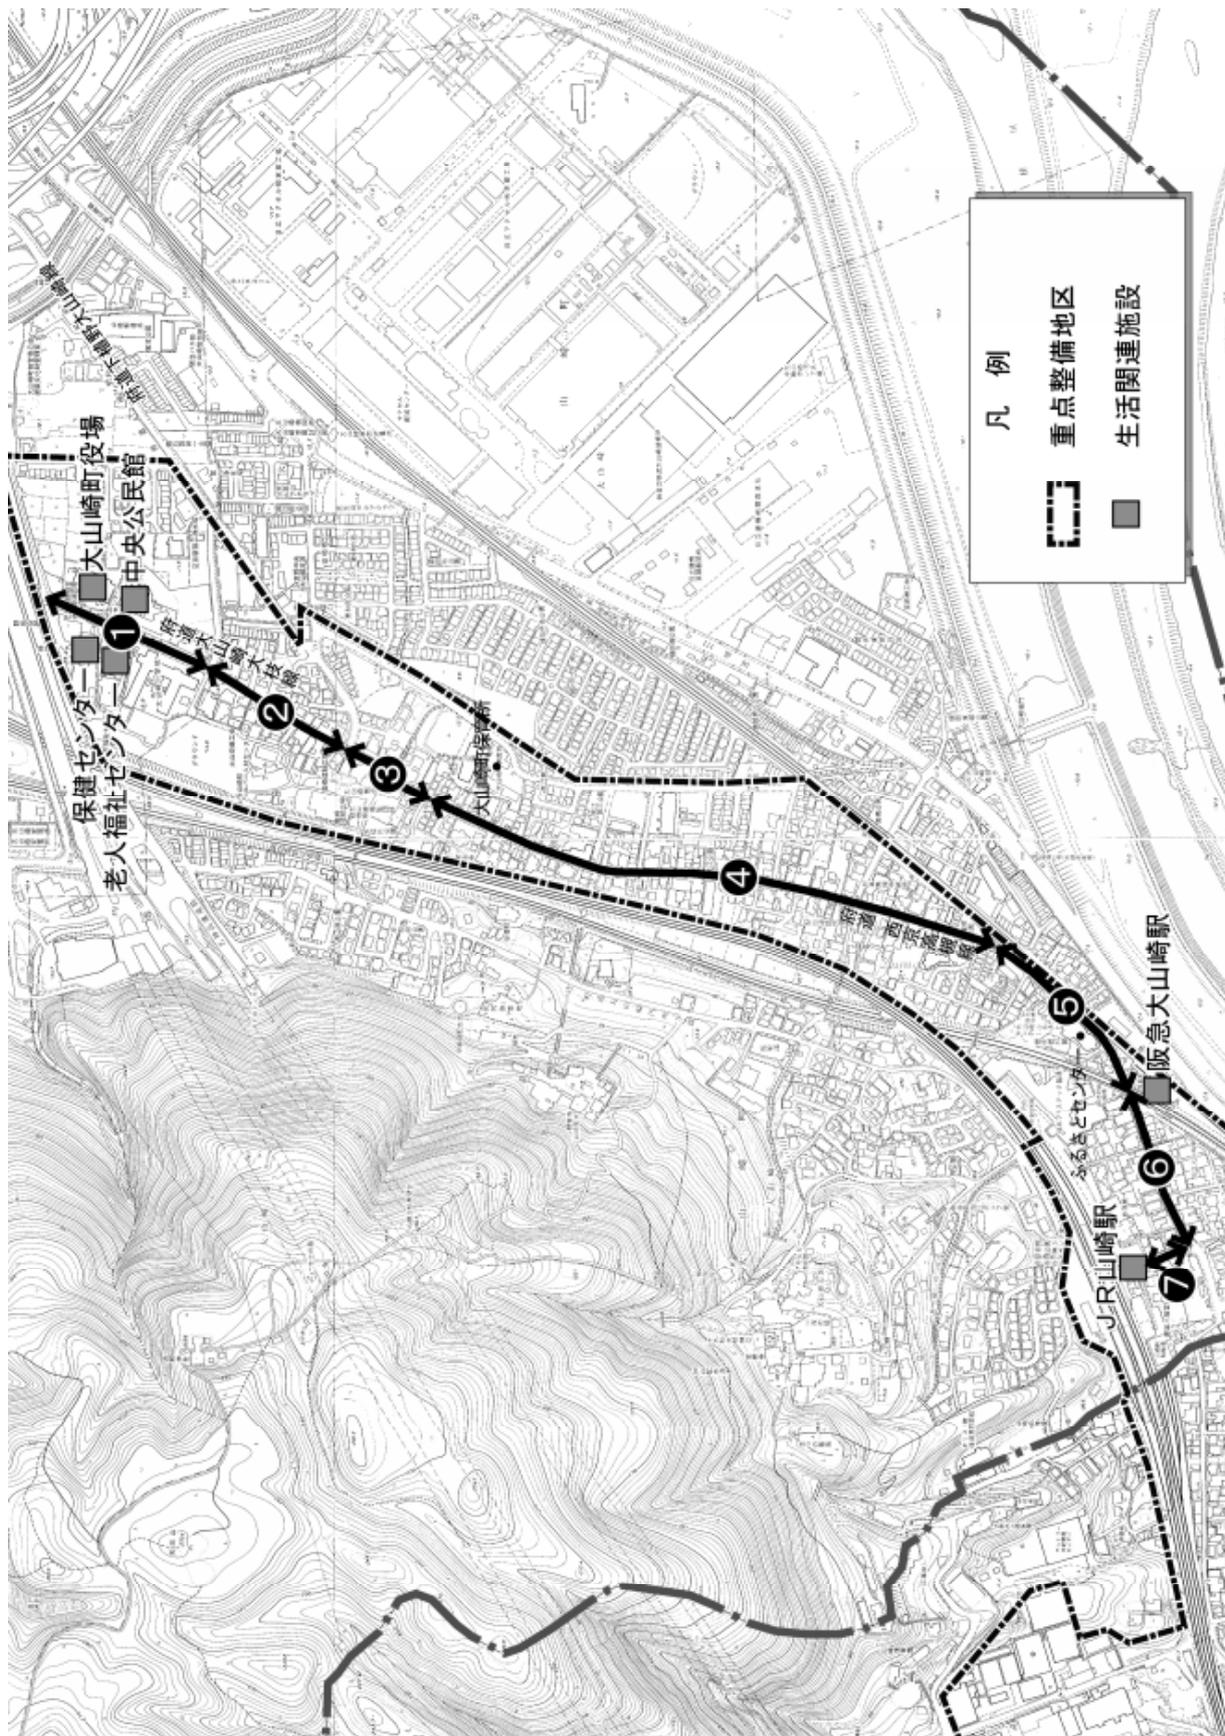

●準生活関連経路

■府道 ①下植野大山崎線

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○歩道の改修	平成 22 年度	未着手	

■町道 ②町道 11 号線

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○歩道の改修	平成 22 年度	未着手	

■町道 ③町道 28 号線

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○歩道の改修	平成 28 年度	未着手	中期目標
◇横断歩道の設置の検討	平成 22 年度	未着手	

■町道 ④町道 52 号線

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
○カラー舗装等による歩行者の安全性向上の検討	平成 22 年度	未着手	

【準生活関連経路 路線番号図】



4. その他

○JR山崎駅前広場

【整備目標】

項 目	目標年次	進捗状況	備 考
J R 山崎駅前広場は、駅舎の整備手法と合わせて、大山崎町としての案を策定中であり、案がまとまり次第事業者と協議を開始するものとする。	—	未着手	

